




1 SCARICO DAL MEZZO DI TRASPORTO IN CANTIERE PER MEZZO DI GRU, CON N.4 CHIODI DA 5ton POSIZIONATI SULL'ESTRADOSSO DELLA SOLETTA DI BASE

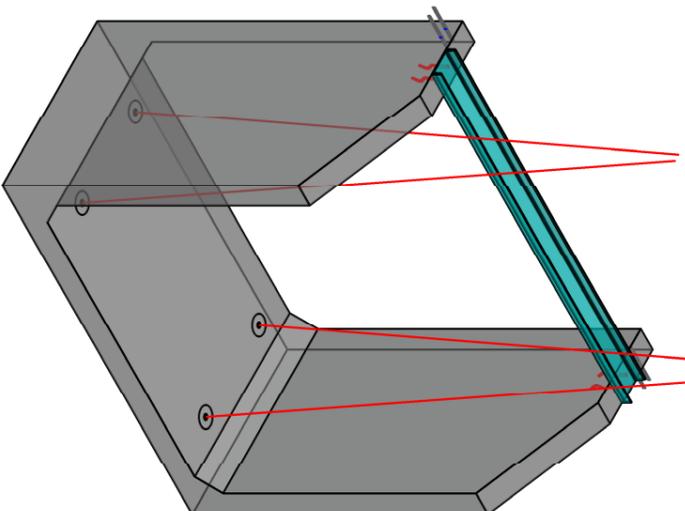


2 SCARICO DAL MEZZO DI TRASPORTO DEI TRIANGOLI DI SOMMITA' DA POSARE SINGOLARMENTE PER MEZZO DEL CHIODO DA 5 ton

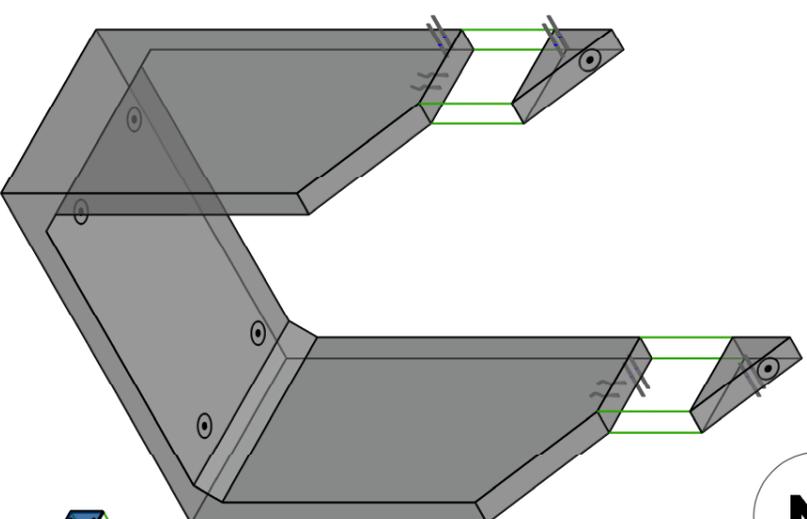

3 MONTAGGIO DELLE PIASTRE IN ACCIAIO E SERRAGGIO DEI BULLONI SULLE BARRE IN ACCIAIO GIA' PREDISPOSTE NELLO SPESSORE DEI SINGOLI ELEMENTI PREFABBRICATI

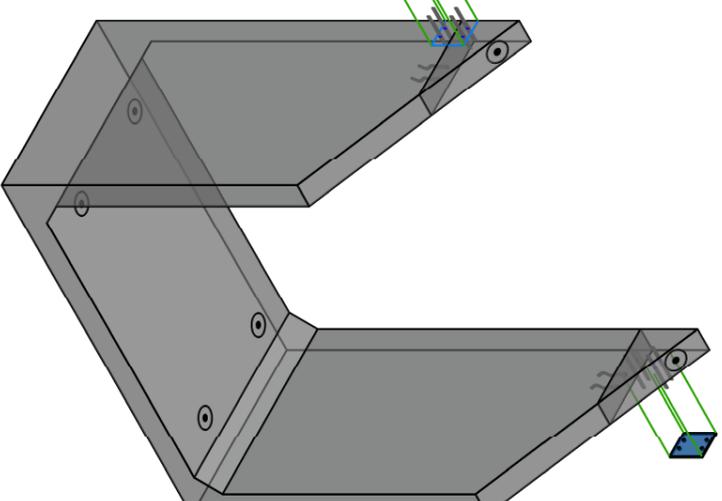

4 ELEMENTO PREFABBRICATO ASSEMBLATO

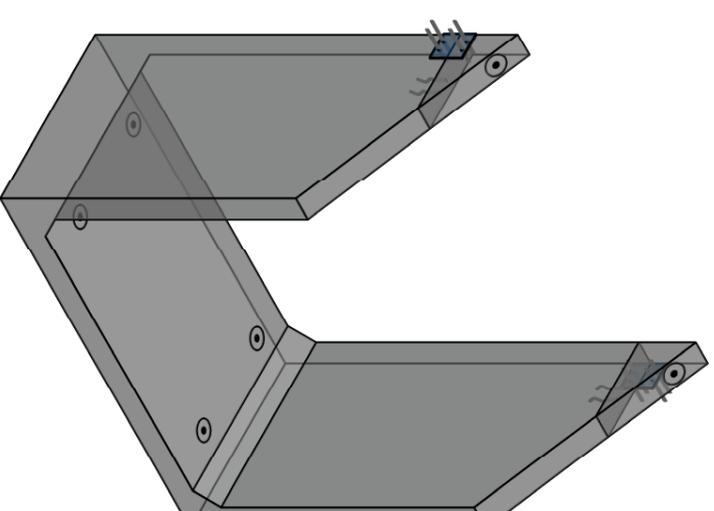

PROFILO LONGITUDINALE SOTTOPASSO

